



# Verslag

VERSLAG NR

GEN/15/61083578/00/NL/000



040 - INSP

## Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

Zeedijk 124/201 - 8620 Nieuwpoort



Uitgevoerd op: 26/04/2022



Uitgevoerd door: TOM DELAVIE (3955)

Conform

### IDENTIFICATIE VAN DERDEN

#### Opdrachtgever van de controle

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Naam, Voornaam | ELECTRO SERVICE                   |
| Adres          | Ambachtstraat 1A- 8620 Nieuwpoort |

#### Eigenaar, uitbater of beheerder

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Naam, Voornaam | Immo Bernstein bv                 |
| Adres          | Zeedijk 124/201 - 8620 Nieuwpoort |

#### Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk

Niet van toepassing

### IDENTIFICATIE VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Vinçotte ID        | 100 081 211                       |
| Adres              | Zeedijk 124/201 - 8620 Nieuwpoort |
| EAN-code           | Niet meegedeeld                   |
| Nr Teller          | 14670148                          |
| Teller index dag   | 7336                              |
| Teller index nacht | 6281                              |
| Type installatie   | HUISHOUDELIJKE Inst.              |

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controle van de Vlaamse RSTO  
 Maatschappelijke zetel : Jan Oliebagerslaan 35 1800 Vilvoorde België | Tel : +32 (0) 2747 77 66 | [info@vincotte.be](mailto:info@vincotte.be)  
 BTW BE 0402 726 875 RFP Brussel BNP Paribas Fortis | IBAN BE 01 000 441 442 000 0000 45

## GEGEVENS VAN DE CONTROLE

De controle wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 oktober 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer laagspanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de elektrische installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. van 28/10/2019), in dit document "Boek 1" genoemd.

|  |   |   |
|--|---|---|
| Type controle                              | - | Controlebezoek (6.5.)   |
| Datum van de uitvoering van de installatie | - | Vanaf 01/10/1981 en vóór 01/06/2020   |
| Informatie inhoud controle                 | - | Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd. |
| Afwijkingen                                | - | Toepassing van deel 8   |

## GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

|   |             |
|---|-------------|
| Spanning (V)  | 400         |
| Aard van de stroom  | Driefasig   |
| Type van aardelektrode                                    | Aardingseis |
| Voedingsleiding - Type                                    | XYB         |
| Voedingsleiding - Doorsnede (mm <sup>2</sup> )            | 70          |
| Aantal eindstroombanen                                    | 10          |
| Type van het aardverbindingssysteem                       | TN          |
| Nominale waarde van de bescherming van de aansluiting (A) | 40          |
| Geplaatste (alg.) differentieelstroominrichtingen         | 2           |

| Differentieel | I <sub>n</sub> (A) | Gevoeligheid (mA) | Type |
|---------------|--------------------|-------------------|------|
| Diff          | 40                 | 300               | A    |

## Beschrijving van de elektrische installatie

|                    |    |
|--------------------|----|
| EB                 |    |
| Aantal stroombanen | 10 |

## SCHEMA'S EN PLANNEN VAN DE INSTALLATIE

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Eendraadsschema - versie  | 1                      |
| Eendraadsschema - datum   | 25/04/2022             |
| Eendraadsschema           | Zie bijlagen           |
| Situatieplan - referentie | Electroservicenuwpoort |
| Situatieplan - versie     | 1                      |
| Situatieplan - datum      | 25/04/2022             |
| Situatieplan              | Zie bijlagen           |



# Verlag

**VERSLAG NR**  
GEN/15/61083578/00/NL/000

## RESULTATEN VAN DE CONTROLE

### Uitgevoerde controles

|  |         |
|--|---------|
| Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen      | In orde |
| Staat van het vast geïnstalleerd elektrische materieel   | Ok      |
| Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking        | Ok      |
| Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen | In orde |
| Visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen          | In orde |

### Metingen en beproevingen

|  |      |
|--|------|
| Spreidingsweerstand van de aardverbinding(en) ( $\Omega$ )   | 75,8 |
| Test werking van de differentieelstroominrichtingen (testknop)   | Ok   |
| Test werking van de differentieelstroominrichtingen (foutlus)  | Ok   |
| Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders | Ok   |

### Vastgestelde inbreuken

- Nihil

### Opmerkingen

#### Badk

- Bijkomende equipotentiaal verbinding niet zichtbaar/niet bereikbaar ; Bijkomende equipotentiaal verbinding niet zichtbaar/niet bereikbaar



## BESLUIT VAN DE CONTROLE

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 (KB van 8/09/2019) inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Er dient gevolg gegeven te worden aan de opmerkingen/aanbevelingen die in dit verslag geformuleerd zijn.

Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 26/4/2047.

De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden opnieuw gedateerd en ondertekend.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden reeds verzegeld.

Ing. J. Windey  
Directeur-generaal Vincotte

## VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.



# Verlag

VERSLAG NR  
GEN/15/61083578/00/NL/000

Bijlagen

Foto situatieplan (1/1)


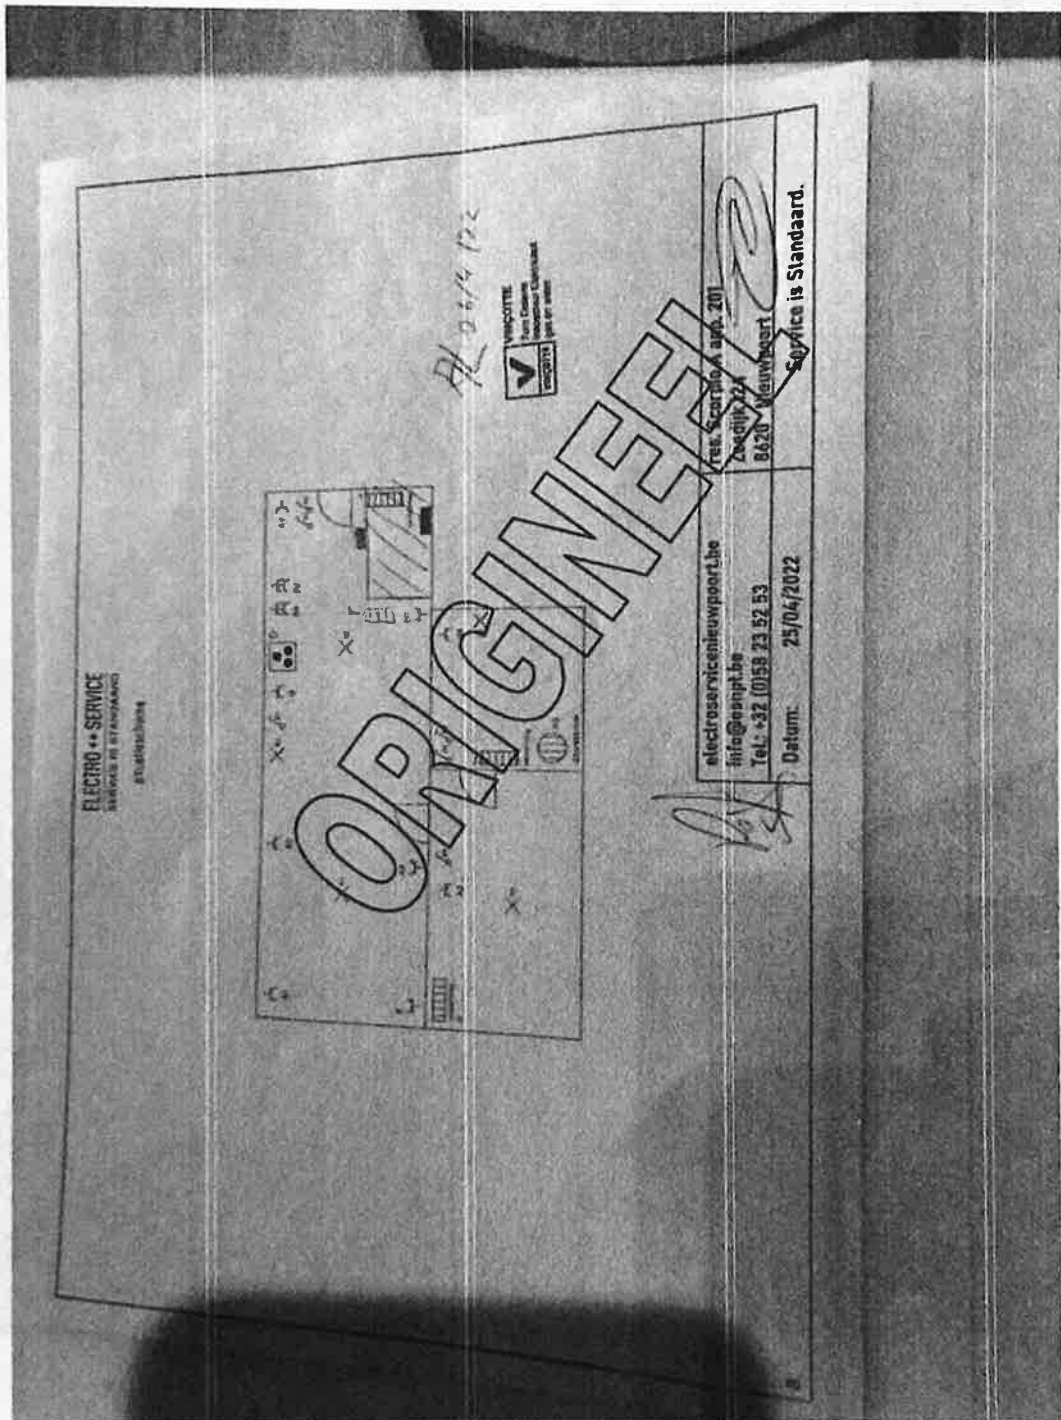


Foto van de eendraadschema's (1/2)




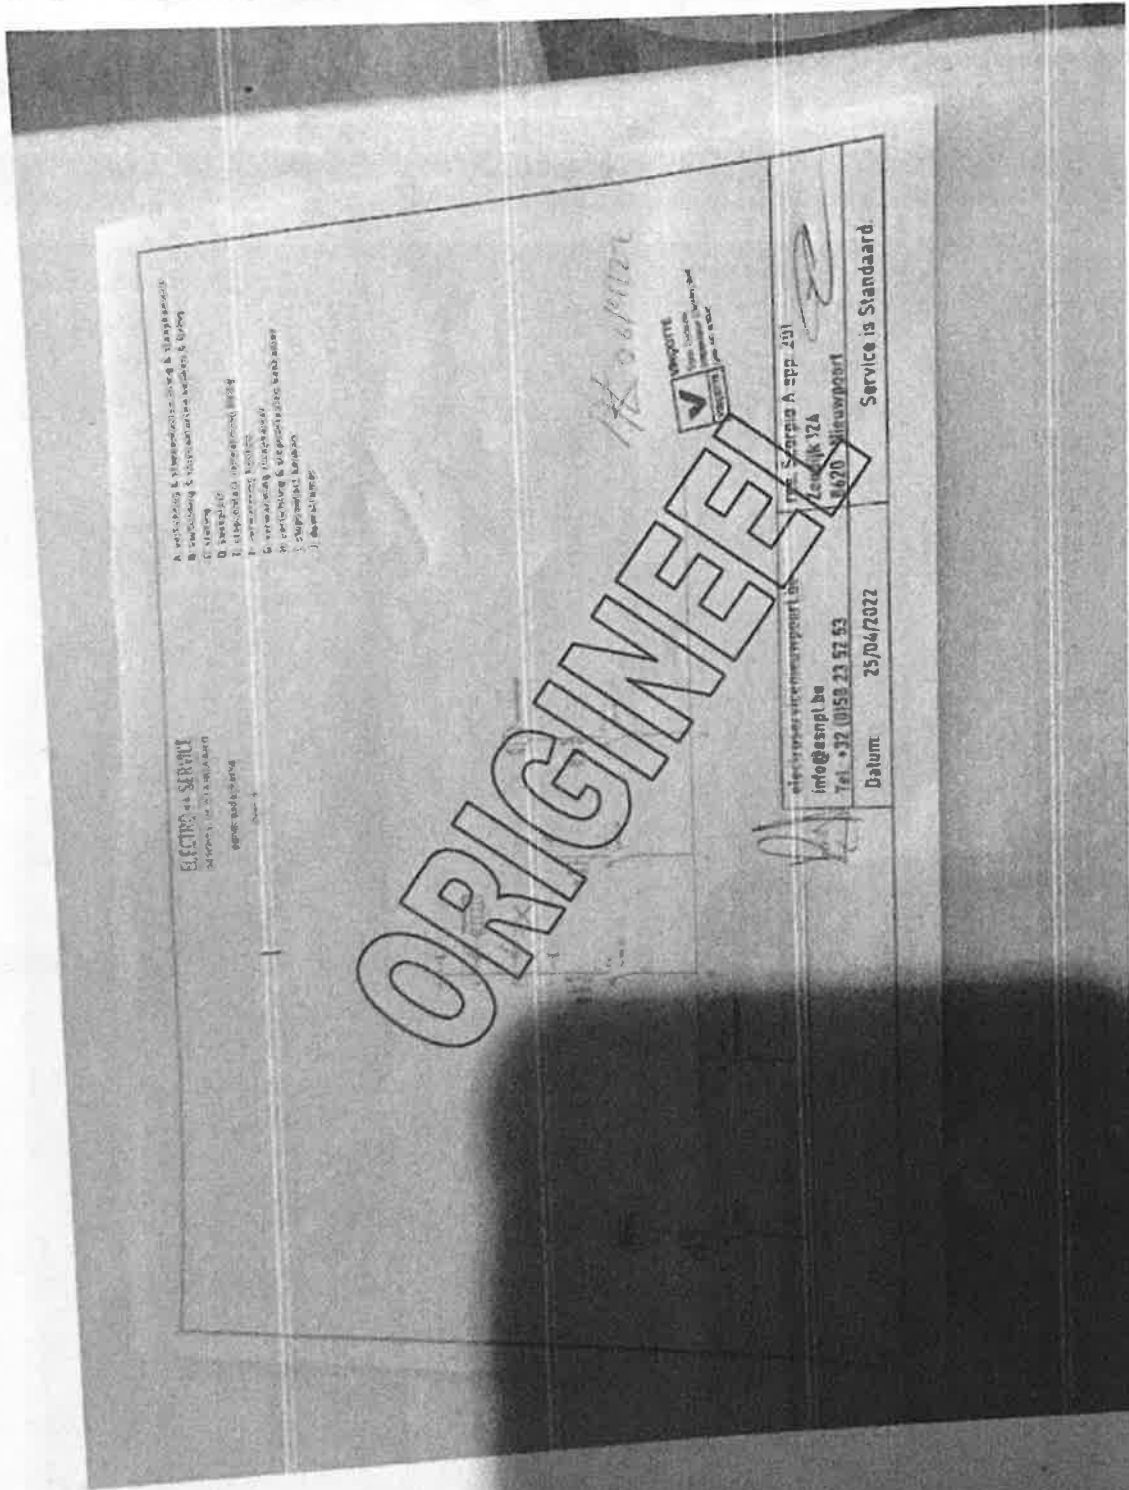

# Verlag

VERSLAG NR  
GEN/15/61083578/00/NL/000


Foto van de eendraadschema's (2/2)

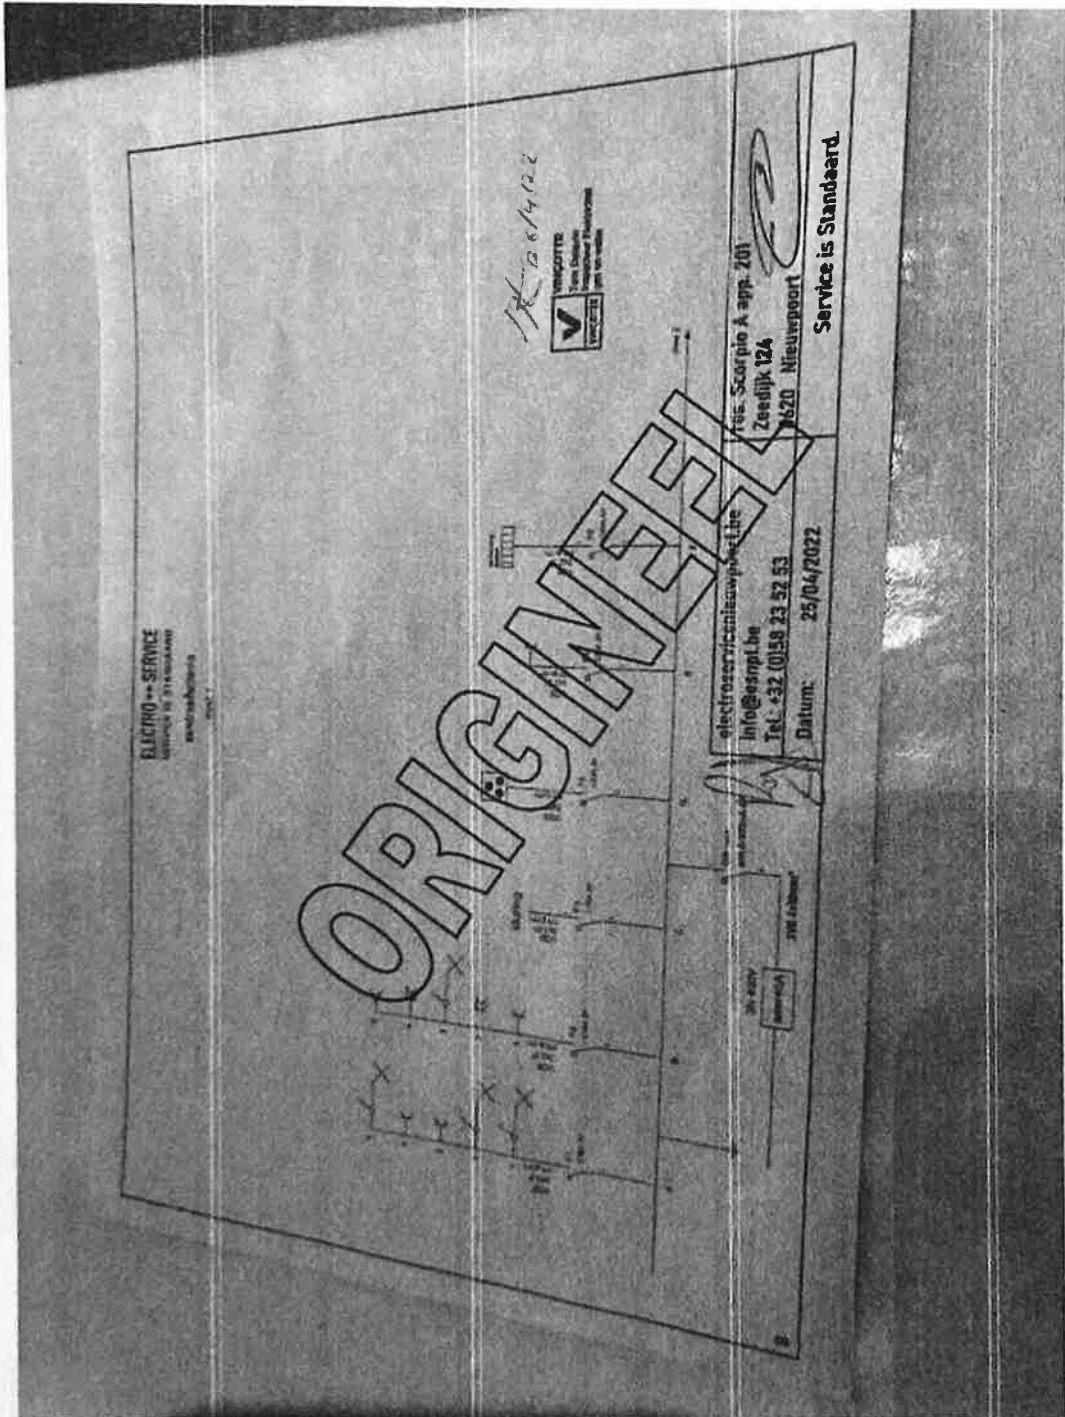


# ELECTRO SERVICE

SERVICE IS STANDAARD

situatieschema

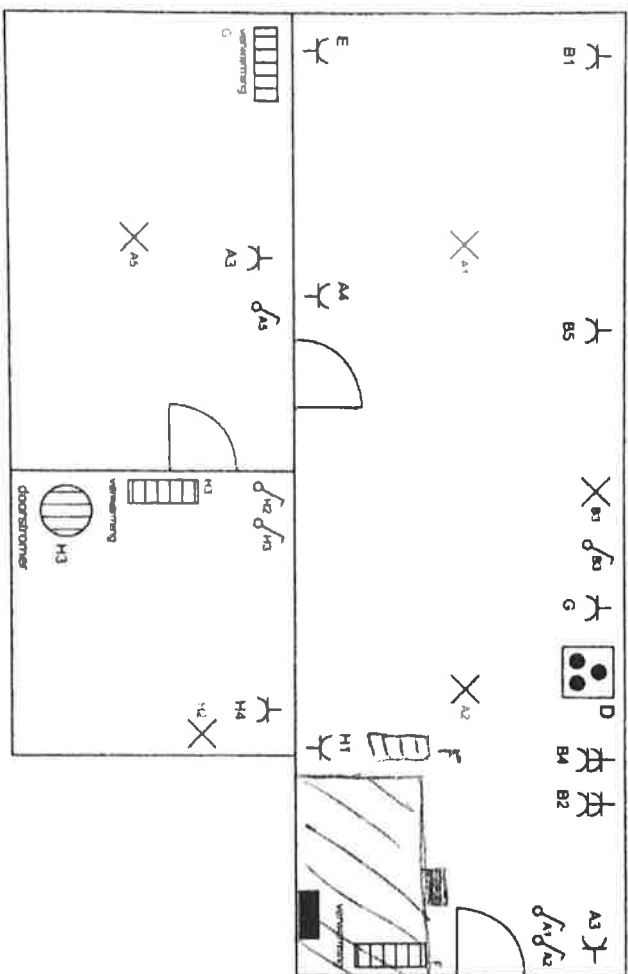

26/11/22



electroservicenuwpoort.be

info@esnpt.be

Tel.: +32 (0)58 23 52 53

Datum: 25/04/2022

res. Scorpio A app. 201


Zeedijk 124

8620 Nieuwpoort

Service is Standaard.



eendraadschema  
deel 2

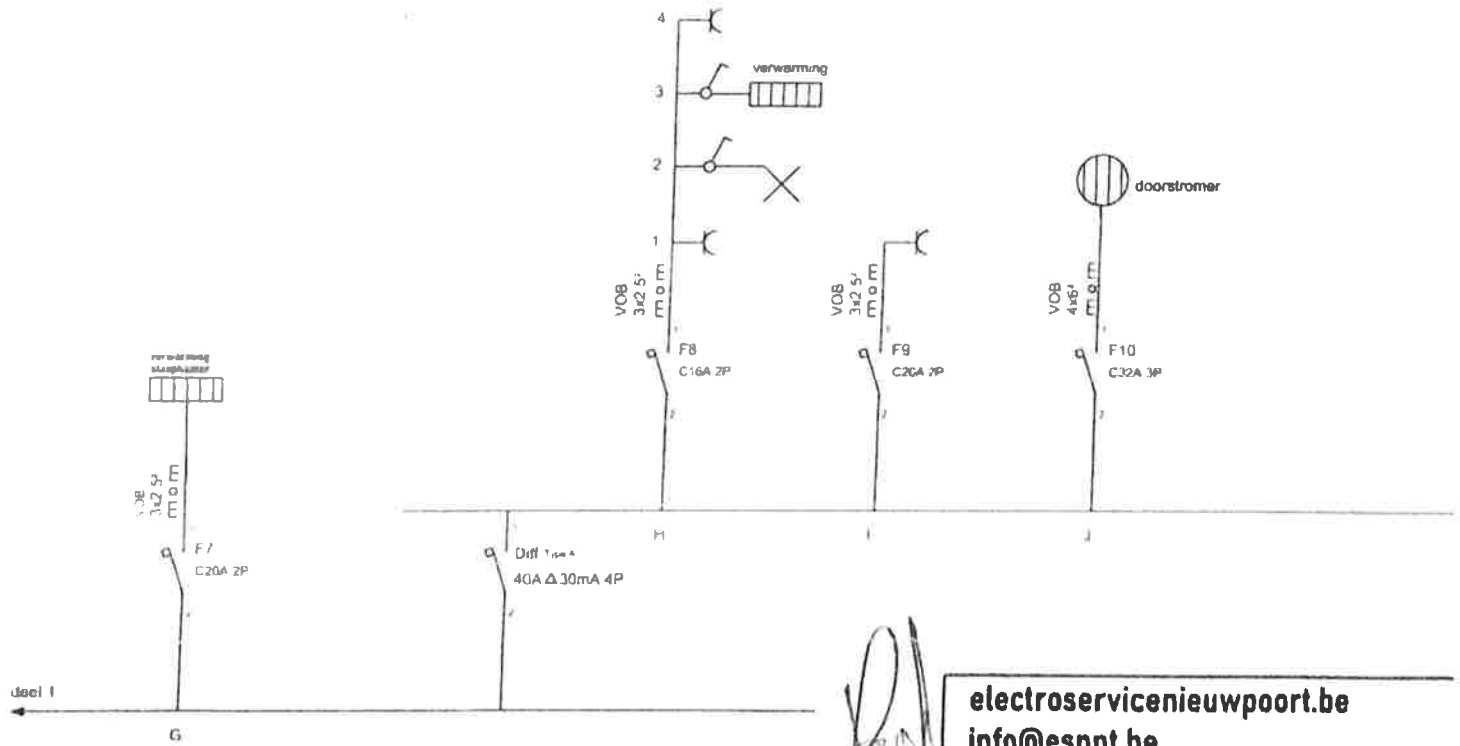

**electroservicenuwpoort.be**  
**info@esnpt.be**  
**Tel.: +32 (0)58 23 52 53**

**Datum: 25/04/2022**

## eendraadschema

deel 1

